Burndown - Sprint 2


SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan histórico: 7 al 19 de septiembre. Jira conserva Sprint 2 - Histórico en estado future, sin fechas. Ese contenedor no acredita inicio ni cierre de una ceremonia.

Qué puede medirse

La base actual es 13 puntos. El compromiso histórico reconstruido de 29 puntos incluía arrastres y no es directamente comparable. Al corte, ninguna historia de este conjunto está en Terminada: restan 13 puntos de aceptación. No representa 13 puntos sin programar.

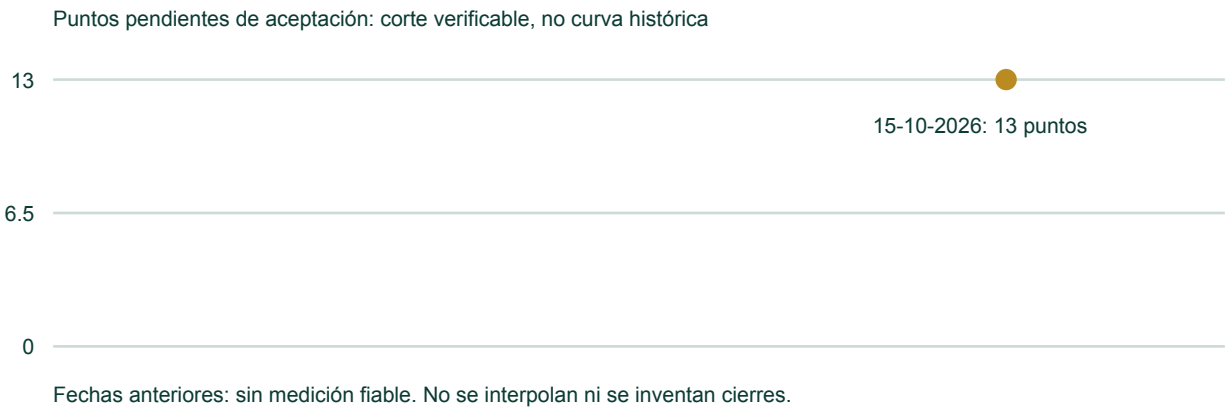

Calidad del historial

No hay una serie diaria validada suficiente para dibujar una curva real. Se muestra solamente el corte comprobado. No se trazan descensos retroactivos ni una llegada proyectada a cero como si fueran hechos.

Registro desde ahora

Después de cada actualización conservar fecha, puntos por historia y cambios de alcance. Separar puntos añadidos o retirados de historias aceptadas; las subtareas no se cuentan nuevamente. Vincular la aceptación al comentario o acta real del PO.
