# Burndown - Sprint 3


SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan documental inicial: 21 de septiembre al 3 de octubre. Jira: Sprint 3 - Actual, activo, del 24 de septiembre al 8 de octubre. El 15 de octubre sigue abierto; la implementación registrada ese día es posterior al plazo. No se modifica ni se oculta esta desviación.

## Qué puede medirse

La base del conjunto consultado es 29 puntos. Al corte, ninguna historia de este conjunto está en Terminada: restan 29 puntos de aceptación. No representa 29 puntos sin programar.

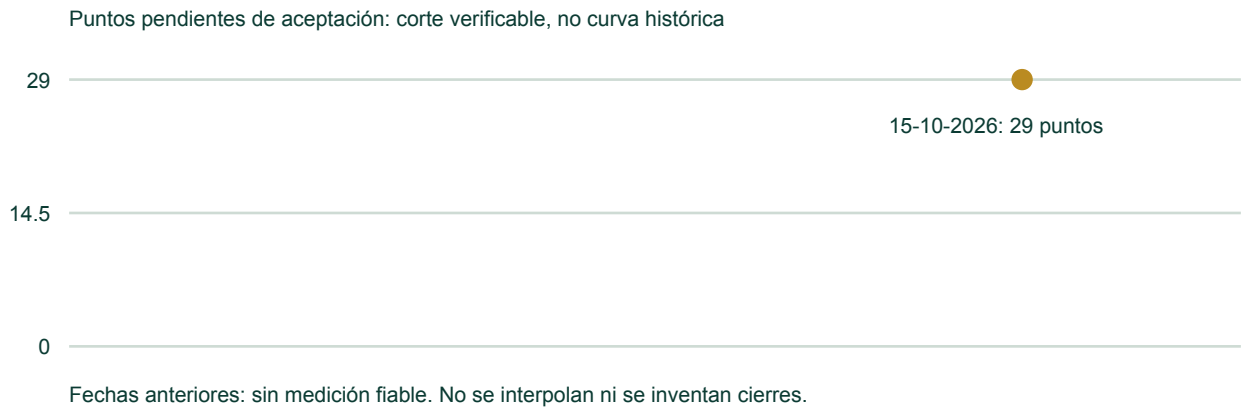


## Calidad del historial

No hay una serie diaria validada suficiente para dibujar una curva real. Se muestra solamente el corte comprobado. No se trazan descensos retroactivos ni una llegada proyectada a cero como si fueran hechos.

## Registro desde ahora

Después de cada actualización conservar fecha, puntos por historia y cambios de alcance. Separar puntos añadidos o retirados de historias aceptadas; las subtareas no se cuentan nuevamente. Vincular la aceptación al comentario o acta real del PO.
