Burndown - Sprint 4


SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Jira: Sprint 4 - Asistencia/Alertas, activo, del 5 al 17 de octubre. Se conserva el sprint existente id 37. La referencia antigua id 36 no se usa.

Qué puede medirse

La base del conjunto consultado es 34 puntos. Al corte, ninguna historia de este conjunto está en Terminada: restan 34 puntos de aceptación. No representa 34 puntos sin programar.

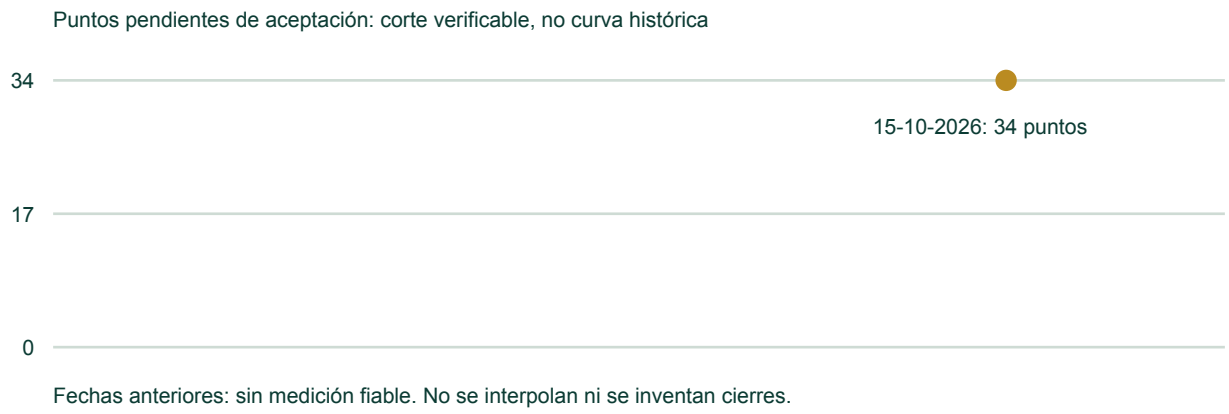

Calidad del historial

No hay una serie diaria validada suficiente para dibujar una curva real. Se muestra solamente el corte comprobado. No se trazan descensos retroactivos ni una llegada proyectada a cero como si fueran hechos.

Se retira la antigua curva 34 → 26 → 10 → 5 y su proyección de cierre: no coincide con las historias reabiertas ni con el estado actual.

Registro desde ahora

Después de cada actualización conservar fecha, puntos por historia y cambios de alcance. Separar puntos añadidos o retirados de historias aceptadas; las subtareas no se cuentan nuevamente. Vincular la aceptación al comentario o acta real del PO.
