01 / ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Informe de actualización SIGAA

28 de octubre de 2026 · Capstone 2026 · Fase 2

SIGAA es un sistema de gestión académica y seguimiento para colegios y liceos. Reúne registros escolares, asistencia, calificaciones y alertas, con acceso diferenciado para docentes, estudiantes y personal del establecimiento.

Estado general

El desarrollo se encuentra en **Sprint 5: Seguimiento**. El incremento 0.9.0 incorpora casos, apoderados y ficha integral, con persistencia en base de datos y pruebas locales registradas. Las tres historias están **en revisión**. La integración a la rama principal, el despliegue de este incremento y su aceptación por Joel como responsable del producto siguen pendientes.

Jira al corte	Historias	Puntos estimados
Terminadas	2	13
En revisión	25	156
En curso	4	34
Pendientes	9	52
Total de historias PB	40	255

Las 40 historias excluyen tareas y subtareas para evitar doble conteo. Los puntos estiman esfuerzo relativo, no horas. El estado “en revisión” no acredita aceptación ni equivale a porcentaje terminado.

Prioridad inmediata

Validar el Sprint 5 en Docker con PostgreSQL 16, revisar los tres módulos con el responsable del producto y preparar la integración y publicación. En paralelo, resolver los pendientes históricos y las evidencias académicas individuales.

Base del informe

Repositorio nuevo SIGAA-Capstone-2026, código 9f45b12 y solicitud de integración #1 abierta. Evidencia de pruebas del 28 de octubre y consulta de las 40 historias PB de Jira. Este corte documental no incluye una nueva comprobación del servidor público.

02 / ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Avance acumulado por sprint

Sprint	Qué existe	Qué falta para cerrar
1 · Diseño	Arquitectura, modelo de datos, prototipo y definición de los modelos docente y estudiante. Adaptación al contexto escolar.	Completar UML, contrastar alcance del estudiante, validar modelo de datos y evidencias de Fase 1.
2 · Plataforma	Estructura escolar y configuración Docker. Catálogos de períodos, niveles, asignaturas, cursos y asignaciones.	Validar entorno reproducible e instalación desde un equipo limpio. Registrar aceptación.
3 · Seguridad	Inicio de sesión con sesiones persistentes, permisos del servidor, gestión de estudiantes y matrículas con historial.	Aceptación por rol y cierre formal de historias en revisión.
4 · Operación	Notas y publicación, asistencia, anotaciones, reglas de alerta, bandeja de seguimiento y justificaciones de Inspectoría.	Revisión del usuario, aceptación de reglas y evidencias oficiales del avance de Fase 2.
5 · Seguimiento	Casos, apoderados y ficha integral implementados y probados localmente. Tres PDF específicos disponibles.	Docker/PostgreSQL 16, integración, despliegue y aprobación. Notificaciones pendientes según capacidad.

Cómo interpretar los sprints

La ventana planificada del Sprint 5 es del **19 al 31 de octubre**. Jira registra su activación real el **28 de octubre**. Los sprints históricos mantienen estados administrativos abiertos o futuros que no representan una nueva ejecución: requieren conciliación y cierre con evidencia y aceptación.


Funcionalidad transversal

El docente opera sobre sus cursos asignados. El estudiante consulta sus propios registros publicados. Administración gestiona la estructura escolar y los registros autorizados. Inspectoría utiliza alertas, justificaciones y seguimiento. Los controles se aplican en la API, además de la interfaz.

03 / ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Sprint 5: seguimiento con registros persistentes

Historia existente	Resultado del incremento
SCRUM-35 · PB-023 Casos	Apertura desde una alerta, responsable, prioridad, acción y fecha próxima. Intervenciones, cierre con resultado, reapertura e historial conservado. Un caso activo por alerta.
SCRUM-48 · PB-036 Apoderados	Registro y edición de contacto, estado y vínculos con estudiantes. Un apoderado principal activo por estudiante. Control de duplicados, historial y permisos.
SCRUM-36 · PB-024 Ficha integral	Consolida matrícula, notas publicadas, asistencia y antecedentes autorizados de seguimiento. La vista del estudiante limita la consulta a sus propios datos publicados.

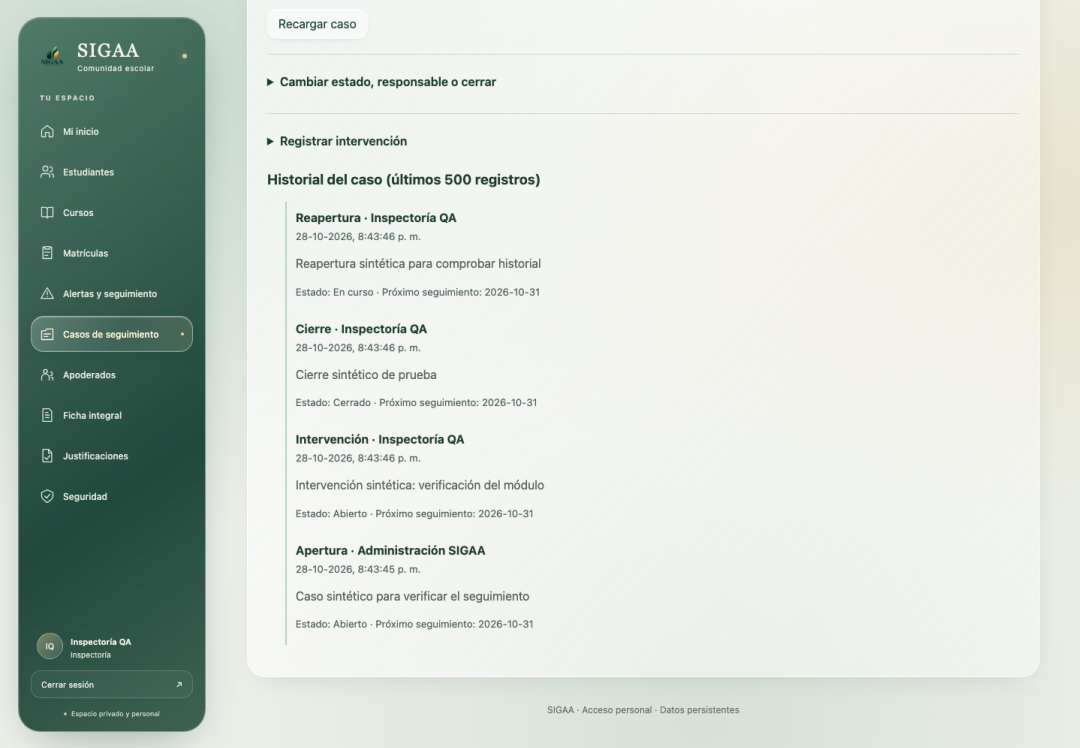

Captura de verificación local, 28/10/2026. Los nombres y registros son datos sintéticos de prueba.

Las tres historias siguen en revisión. Este alcance no incluye acceso de apoderados al portal ni envío de notificaciones. La ficha muestra hasta 500 registros por sección y avisa cuando el resultado se limita.

04 / ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Arquitectura, calidad y despliegue

Capa	Tecnología y función
Interfaz	React 19.2.8 y Vite 8.2.4. Vistas por rol, diseño adaptable a móvil y componentes visuales de SIGAA.
Servidor	Node.js 22 y Express 5.2.1. Sesiones, permisos, validaciones, reglas y operaciones transaccionales.
Datos	PostgreSQL. Migraciones 001 a 009. Objetivo de despliegue: PostgreSQL 16. Pruebas del incremento: PostgreSQL 14 aislado.
Operación	Docker Compose y Nginx. Publicación documentada mediante servidor Mac y túnel Cloudflare con dominio SIGAA.

Evidencia disponible del 28 de octubre

Verificación	Resultado documentado
Pruebas unitarias	6 aprobadas
Pruebas de integración	57 aprobadas
Escenarios de navegador	8 nuevos + 11 de regresión
Compilación web	Aprobada

Las 13 comprobaciones específicas de seguimiento forman parte de las 57 pruebas de integración y no se suman otra vez. Se verificaron permisos, persistencia tras reinicio, cambios concurrentes y recorridos en Chromium, incluyendo móvil.

Límites que deben resolverse

El motor Docker no estaba operativo durante esa validación. Aún se debe ejecutar el conjunto en Docker/PostgreSQL 16, ampliar las pruebas a otros navegadores, accesibilidad y carga, y demostrar restauración de un respaldo en un ambiente aislado.

El incremento 0.9.0 sigue en la rama de trabajo y en la solicitud de integración #1. El último despliegue documentado corresponde a 0.8.0. Este informe no acredita despliegue de 0.9.0 ni una verificación nueva de HTTPS o disponibilidad pública.

05 / ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Desarrollo que falta

Prioridad y referencia	Trabajo pendiente / evidencia de cierre
Obligatorio SCRUM-21 / PB-009	Actualizar diagramas UML con los flujos persistentes y los permisos reales. Revisar coherencia con la aplicación.
Obligatorio SCRUM-51 / PB-039	Contrastar asignaturas, notas, asistencia, calendario y anotaciones del estudiante con los criterios completos. Corregir lo que falte.
Obligatorio SCRUM-52 / PB-040	Probar instalación del equipo, aislamiento de servidor y base de datos, y HTTPS desde acceso normal y varios dispositivos.
Obligatorio SCRUM-40 / PB-028	Completar consulta y cobertura de auditoría de cambios sensibles. Ya existen eventos generados por la API, pero no cubren el cierre de la historia.
Obligatorio SCRUM-41 / PB-029	Completar pruebas integrales, seguridad, carga y accesibilidad. Demostrar respaldo y restauración sin tocar datos operativos.
Según capacidad SCRUM-37 / PB-025	Notificaciones internas. Sigue pendiente en Sprint 5. Confirmar inclusión o reprogramación explícita con el responsable del producto.
Según capacidad SCRUM-38 / PB-026	Indicadores agregados: acordar métricas, implementar cálculos y comprobar que no expongan datos indebidos.
Fuera de compromiso SCRUM-30 / PB-018 SCRUM-39 / PB-027	Importación validada y exportación de reportes. Pendientes sin fecha comprometida. Decidir alcance después de asegurar lo obligatorio.

Además del código

El Sprint 6 incluye el manual técnico (SCRUM-42), manual de usuario (SCRUM-43) y propuesta de valor con evidencia (SCRUM-44). La entrega final de Fase 2 (SCRUM-45) y la defensa y retrospectiva final (SCRUM-46) permanecen pendientes.

La clasificación anterior conserva las prioridades del cronograma registrado. Las funciones opcionales solo pueden salir del alcance mediante una decisión explícita y documentada.

06 / ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Documentación y trabajo Scrum

Ámbito	Disponible	Pendiente real
Fase 1	Definición, presentación y autoevaluación de competencias de Joel corregida.	Diarios individuales auténticos de SIGAA. Adaptación y validación personal de Matías. Revisión de otras autoevaluaciones y acta existente.
Fase 2	Informe de avance, documentos técnicos y expedientes de sprints 0 a 5. Sprint 5 tiene implementación, manual y seguimiento en PDF.	Versiones oficiales completas, guía 2.4 revisada, diarios ratificados, planillas evaluadas y futuro informe final 2.6.
Fase 3	Estructura de carpetas preparada.	Diarios individuales, planilla evaluada, presentación final, defensa y cierre.
Manuales y modelos	Documentos parciales y manual específico de Sprint 5.	Manual integral por rol, manual técnico actualizado, modelo de datos con migración 009 y UML completo.

Registros de reuniones y seguimiento

Planificación y backlog. Conservar las historias existentes, su asignación al sprint y la evidencia del cambio. Sprint 5: 21 puntos en revisión y 5 pendientes, sin puntos aceptados.

Daily. Los registros técnicos o reconstrucciones históricas no prueban una reunión. El equipo debe registrar las reuniones reales con fecha, participantes, avances e impedimentos.

Review y retrospectiva. La revisión del producto y la conversación de mejoras del Sprint 5 siguen pendientes. Registrar acuerdos y aceptación únicamente cuando ocurran.

Gráfico de trabajo restante. No inferir esfuerzo consumido ni una curva diaria con datos inexistentes. Mantener el estado real y la fecha efectiva de cada cambio.

La presencia de archivos en GitHub no acredita entrega ni aprobación en Campus. Guardar comprobantes de envío y retroalimentación. Este informe y la presentación de avance no sustituyen formularios oficiales ni evaluaciones personales.

07 / ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Calendario y responsabilidades propuestas

Ventana	Resultado esperado	Responsabilidad propuesta
28–31 oct Sprint 5	Prueba Docker/PG16, revisión de casos, apoderados y ficha. Resolver observaciones, integrar y preparar despliegue.	Joel: revisión funcional y decisión de alcance. Matías: entorno y persistencia. Agustín: recorridos por rol y manual.
2–7 nov Sprint 6	Auditoría consultable, alcance de indicadores acordado y pendientes históricos corregidos.	Joel: auditoría. Agustín: indicadores y vista estudiante. Matías: aislamiento y revisión de pruebas.
9–14 nov Sprint 6	Pruebas completas, restauración demostrada y manuales consolidados. Informe de valor diferencial.	Matías: pruebas y restauración. Joel: manual técnico. Agustín: manual de usuario. Equipo: valor y revisión cruzada.
16–21 nov Sprint 7	Informe final Fase 2, producto estable y entrega en Campus con comprobante.	Los tres: informe, demostración y revisión. Joel coordina aceptación del producto.
22–28 nov Sprint 7	Correcciones derivadas de la evaluación y preparación de defensa.	Reparto por observaciones y revisión cruzada de los tres integrantes.
30 nov–12 dic Fase 3	Defensa, respuestas a observaciones y retrospectiva real del proyecto.	Equipo completo. Cada integrante presenta su aporte y completa sus evidencias personales.

Condiciones del calendario

Son ventanas de planificación, no fechas de trabajo realizado ni compromisos ratificados. Confirmar en Campus el día y hora exactos de cada entrega. El reparto combina desarrollo, pruebas y documentación para los tres integrantes y requiere acuerdo del equipo.

Los pendientes de UML, modelo estudiante y aislamiento tenían una ventana de recuperación hasta el 24 de octubre. Se deben resolver en paralelo al cierre técnico de Sprint 5 para evitar trasladar la deuda al final.

08 / ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Criterios para cerrar el proyecto

1. Alcance acordado. Joel valida qué historias son obligatorias, cuáles se entregan y cuáles se aplazan. Cada decisión queda vinculada a su tarjeta existente.

2. Producto integrado y verificable. Revisar y fusionar los cambios aprobados. Preparar respaldo, ejecutar migraciones y desplegar. Verificar inicio de sesión, permisos y flujos escolares en el servidor con HTTPS.

3. Calidad y recuperación. Registrar pruebas en Docker/PostgreSQL 16, navegadores y móvil, controles de privacidad, resultados de carga y una restauración exitosa en ambiente aislado.

4. Documentación coherente. Actualizar modelos, manuales, informe final, calendario y Jira. Cada historia debe tener evidencia y aceptación para pasar a terminada. Conservar pendientes reales.

5. Entrega académica y defensa. Completar formularios personales con sus autores, enviar los documentos requeridos, conservar comprobantes y preparar una demostración ensayada. Registrar la retrospectiva cuando el equipo la realice.

Próximas acciones recomendadas

Primero: ejecutar la validación pendiente de Docker y realizar la revisión del Sprint 5.
Después: resolver observaciones, aceptar e integrar el incremento y verificar su despliegue.
En paralelo: cerrar los pendientes históricos y completar las evidencias académicas personales antes de la consolidación final.

Fuentes y trazabilidad

Repositorio: github.com/joellopez775/SIGAA-Capstone-2026. Código analizado: 9f45b12. Rama: feature/sprint-5-seguimiento.

Integración pendiente: solicitud #1 del repositorio, abierta al corte.

Jira: tablero SCRUM de SIGAA. Historias SCRUM-13 a SCRUM-52. Resumen conservado en output/evidence/actualizacion-2026-10-28.json.

Evidencia de pruebas: SIGAA/output/evidence/sprint-5/validation.json, browser-results.json y browser-regression.json. Documentación específica: Gestión Scrum SIGAA/PDF/02 Sprints/Sprint 5/.

Estado académico: ESTADO DE ENTREGAS.md del repositorio nuevo. Fechas futuras y prioridades: descripciones de historias y sprints de Jira consultadas el 28/10/2026.

Las capturas provienen de pruebas locales con datos sintéticos. No se afirman reuniones, firmas, aprobaciones, despliegues ni entregas académicas sin evidencia.
