# Avance del proyecto

De la gestión académica al seguimiento escolar. Corte: 5 de noviembre de 2026.

INCREMENTO PUBLICADO

## Más visibilidad para tomar decisiones.

Versión 0.10.0 · sigaa.ignisert.com · HTTPS verificado

| UNITARIAS | INTEGRACIÓN | RECORRIDOS HTTPS | SEMANA ACTUAL |
|---|---|---|---|
| 6 | 69 | 8 | 13 |
| Aprobadas | PostgreSQL 16 | Cuatro roles | Sprint 6 / Fase 2 |

## Qué resuelve SIGAA


Una plataforma para colegios y liceos que reúne asistencia, notas, anotaciones y alertas, y permite reconstruir el acompañamiento de cada estudiante.

| Base ya disponible | Novedades del corte |
|---|---|
| Usuarios, roles y matrículas<br>Clases, asistencia y calificaciones<br>Anotaciones y alertas | Seis indicadores institucionales<br>Consulta administrativa de auditoría<br>Filtro por acción y páginas de 25 |
| Casos y apoderados<br>Ficha integral y avisos<br>Asignaturas y calendario estudiantil | Sin migrar la base<br>API 0.10.0 / esquema 0.9.1<br>Nuevas pruebas de permisos y privacidad |

Datos de ejemplo: 80 estudiantes y 12 docentes ficticios. Los apoderados tienen registro y vínculos; su portal de acceso sigue fuera del alcance.

# Dos nuevas vistas, un mismo sistema

La API comprueba permisos; la interfaz muestra solo los módulos autorizados.

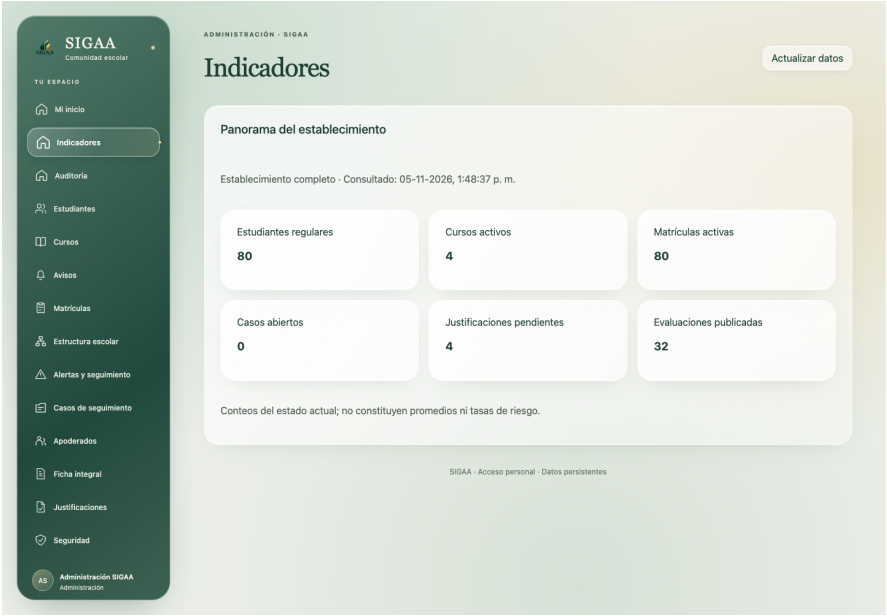


**01 / INDICADORES**

Administración, inspectoría y dirección/UTP consultan estudiantes regulares, cursos activos, matrículas, casos no cerrados, justificaciones pendientes y evaluaciones publicadas.

## 02 / Auditoría administrativa

Autor, fecha, operación y entidad. Filtro de acción exacta, páginas de 25 y acceso exclusivo de administración. La respuesta excluye los valores privados anteriores y nuevos del evento.

| Control ejecutado | Evidencia |
|---|---|
| Permisos y alcance | Se rechazan solicitudes de docentes y estudiantes a los nuevos módulos. |
| Cálculos y privacidad | Conteos contrastados con SQL; prueba de ausencia de payload privado. |
| Operación segura | Respaldo previo y despliegue verificado. Se corrigió la propiedad de archivos de la imagen tras revertir el primer intento. |

# Lo que falta y cómo terminarlo

Las fechas son ventanas de planificación; confirmar el día y la hora de entrega en Campus.

| Ventana | Resultado esperado | Trabajo principal |
|---|---|---|
| 5–7 nov | Incremento revisado | Revisar indicadores y auditoría con el PO. |
| 9–14 nov | Calidad y documentación | Carga, accesibilidad, otros equipos, manuales y valor escolar. |
| 16–21 nov | Entrega de Fase 2 | Consolidar producto, informe, anexos y evidencias oficiales. |
| 23–28 nov | Correcciones | Responder retroalimentación y ensayar defensa. |
| 30 nov–12 dic | Presentación final | Exponer y registrar el cierre real de Fase 3. |

## Responsabilidad compartida

Los tres desarrollan, prueban y documentan. Joel es Product Owner confirmado. Los focos técnicos y el rol de Scrum Master propuesto para Agustín deben ratificarse.

| Joel / revisión de Agustín | Agustín / revisión de Matías | Matías / revisión de Joel |
|---|---|---|
| Integración, operación y revisión del incremento. | Manual por roles, recorrido de interfaz y accesibilidad. | Pruebas de cierre y contraste de valor escolar. |

Pendientes de aceptación: PO, revisión/fusión del PR #1 y validación escolar. Las pruebas emuladas en un Mac no sustituyen ensayos físicos del equipo.
